KOŠAMBRA

SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA KOŠAMBRA

- SADRŽAJ:

- Kronologija dosadašnjih aktivnosti
- Redefinirani Projektni zadatak sanacije odlagališta otpada Košambra
- Izvod iz GENERALNOG IDEJNOG RJEŠENJA za sanaciju odlagališta otpada Košambra u Poreču (izrađen po HIS d.o.o. Donja Višnjica, rujan 2006.g.)
- Grafički prilozi:

  - Situacija postojećeg stanja odlagališta
  - Pregledna situacija sanacije odlagališta
  - Detalji

- Odlagalište je u službenoj upotrebi od 1977. godine
- Od samog početka korištenja njime upravlja «Usluga Poreč» d.o.o.
- Do sada je na odlagalištu odloženo oko 350.000 m3 raznovrsnog otpada.
- Početkom 2001. godine ishodovana je lokacijska dozvola
- Koncem 2001. godine izrađen je Glavni projekt za rekonstrukciju i dogradnju odlagališta.

- Polovicom 2003. godine je za predmetnu građevinu dobivena Građevna dozvola.
- U drugoj polovici 2001. godine Gradovi Poreč i Beč – Republika Austrija, donose i potpisuju «Pismo namjere»
- Poglavarstvo Grada Poreča 11. rujna 2001. godine osniva Radnu grupu za koordinaciju razvojnih projekata
- Zaključkom od 03. svibnja 2002. godine Povjerenstvo je prihvatilo da Grad Poreč postaje pilot projekt u projektu zaštite voda i obrade komunalnog otpada

- 09. srpnja 2002. godine Gradsko Poglavarstvo Grada Poreča donosi Zaključak kojim podržava Projekt Studije odlagališta Košambra izrađenog od strane „Austrijanaca“
- Istim zaključkom utvrđeni su prijedlozi o prihvaćanju Sporazuma i potpisuje se Ugovor o suradnji te osnivanju Adriaplusa sa temeljnim ulogom 51% / 49%
- Gradsko vijeće Grada Poreča dana 25. srpnja 2002. donosi Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Adrijaplus
- Društvo je formalno registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci dana 30.10 2002.godine

- 12. siječnja 2005. godine Gradsko Poglavarstvo daje suglasnost na cjenik postupanja sa otpadom

- 04.05.2005.godine Grad Poreč, Usluga Poreč d.o.o. i Adriaplus potpisuju Ugovor o pružanju usluga, gdje se precizira prijenos upravljanja odlagalištem otpada «Košambra» sa Usluge na Adriaplus

- Adriaplus nije preuzela upravljanje odlagalištem jer je bilo potrebno izvršiti doregistraciju tvrtke i ishodovati dozvolu za zbrinjavanje otpada od Ureda državne uprave Istarske županije

- Početkom 2006.godine zadužuje se Usluga Poreč d.o.o. za revidiranje projektnog zadatka i projektne dokumentacije sukladno:

  - Strategiji gospodarenja otpadom, objavljenoj dana 02.11.2005. u Narodnim novinama RH broj 130/2005,

  - Recenziji projektne dokumentacije sanacije odlagališta otpada koju je Fond dostavio tijekom ožujka 2006.godine

- **IZVOD IZ RECENZIJE**:

  Prema dostavljenoj dokumentaciji, predviđeno vrijeme odlaganja komunalnog otpada je do 2022. godine, odnosno do 2030. godine, što s obzirom na lokalni karakter nije prihvatljivo.

  Za odlagalište Košambra u Poreču potrebno je predvidjeti uz nužnu sanaciju postojećeg tijela odlagališta i pripremu privremenog novog odlagališta do uspostavljanja regionalnog ili županijskog centra za gospodarenje otpadom

- TEMELJNI RAZLOZI ZA PROMJENU PRISTUPA:

  - Nije izvršen formalni prijenos odlagalištem na Adriuplus,
  - Napuštena je koncepcija o obradi kompletnog starog postojećeg otpada
  - Uvažene su odrednice iz Strategije gospodarenja otpadom RH

- 18.5.2006. godine formirano je Povjerenstvo za praćenje projekta sa gradonačelnikom Grada Poreča g. Edijem Štifanićem kao predsjednikom Povjerenstva i članovima: Edo Kos, Milan Laković, Franko Štifanić, Darko Požarić, Ivan Sladonja i Rodoljub Kosić

- Prihvaća se novi Projektni zadatak i raspisuje se natječaj za izradu projektne dokumentacije koja je trebala sadržavati:

  - Generalno idejno urbanističko rješenje odlagališta,
  - Idejno rješenje za sanaciju odlagališta,
  - Glavni projekt na nivou izvedbenog projekta.

- Po objavljenom natječaju posao projektiranja povjeren je «HIS» d.o.o. Donja Višnjica Zagreb

- Primjerak Idejnog rješenja građevinskog projekta proslijeđen je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi dobivanja suglasnosti na tehničko rješenje koje je usklađeno sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

  (suglasnost je dobivena 05.03.2007.godine)

- 11.12.2006. objavljeno je prvo Javno nadmetanje za izvedbu radova na sanaciji odlagališta Košambra u Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (NN 50/06)

- 10.04.2007. objavljeno je drugo Javno nadmetanje za izvedbu radova na sanaciji odlagališta Košambra u Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (NN 15/07)

- Spomenimo usput:

  Ugovorom Grad – Fond od 15.07.2004.g. odobrena su sredstva u iznosu od 23.600.000,00 kn ali je radi kašnjenja sa početkom aktivnosti Aneksom Ugovora produžen rok sufinanciranja od strane Fonda do 2009.godine

IZVOD IZ GENERALNOG IDEJNOG RJEŠENJA

- Postojeće stanje:

  - (geodetski snimak iz 2006.godine)
  - Debljina otpada doseže 10 do 11 metara
  - Otpadom zauzeto cca 5,5 ha
  - Procjena ukupnog volumena oko 350 000 m^3

PROGRAM PRIKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA tijekom 2006. godine

- PET ambalaža **20 608 kg** odnosno **535 808 jedinica**
- MET **228 050 kg** odnosno **100 376 jedinica**
- Staklena **84 845 kg** odnosno **291 867 jedinica**

SUMARNI PODACI

- **333 503 kg** odnosno **928 051 jedinica**

PRIJEDLOG SANACIJE

- A Postojeće tijelo deponije:

  - urediti postojeće tijelo deponije
  - izgraditi sustav za prikupljanje odcjednih i oborinskih voda
  - izgraditi sustav za otplinjavanje

B Novi otpad

Stvoriti pretpostavke za prihvat novog komunalnog otpada za narednih 5 godina

(procjenjuje se da treba stvoriti prostor za ukupno 323 527 tona otpada)

C Rezervirani prostori za izgradnju novih objekata

- Reciklažno dvorište sa sortirnicom

- Postrojenje za MBO (mehaničko biološka obrada) sa kompostanom

AKTUALNO STANJE (per 14.05.2007.)

- Zaključen je 2. natječaj za Sanaciju Košambre

- Donesena je Odluka o izvoditelju – MICHELE d.o.o. iz Pule i proslijeđena svim ponuditeljima

- 12.05.2007. godine Odlagalište je obišla Republička inspektorica zaštite okoliša Eugenia Bessu

- Zaključak inspektorice:

Stanje na odlagalištu je vrlo loše.

S otpadom se ne gospodari sukladno propisima iz članka 4. Zakona o otpadu, niti sukladno propisanim uvjetima odlagališta otpada I kategorije, te je potrebno odmah poduzeti hitne mjere sanacije sukladno izrađenoj dokumentaciji.

- Niti do danas nisu započeti radovi sanacije iako su ispunjeni svi uvjeti za početak radova.
- Odgovorna osoba je dužna dostaviti pismeno izvješće o razlozima odgode početka radova sanacije u roku tri dana.
- Ukoliko se u roku od trideset dana ne započnu radovi, ova će inspekcija izdati mjeru zatvaranja odlagališta.
- Sa predmetne lokacije prijeti opasnost od nastanka požara.

NAPLAĆENA NAMJENSKA SREDSTVA RJ ČISTOĆA U 2006. GODINI

Opis	Obnova voznog parka
Poreč	765.134,98
Vrsar	375.898,20
Višnjan	14.494,30
Vižinada	8.102,50
Kaštelir – Labinci	14.413,51
Sveti Lovreč	9.868,05
UKUPNO	**1.187.911,54**

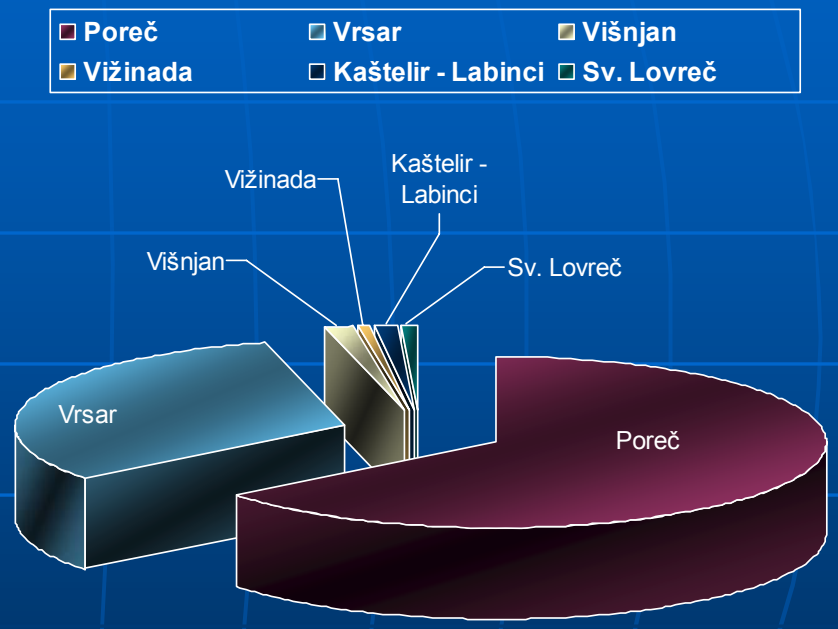

NAPLAĆENA NAMJENSKA SREDSTVA RJ ČISTOĆA U 2006. GODINI

Opis	Sanacija odlagališta
Poreč	1.411.773,48
Vrsar	733.689,59
Višnjan	22.319,55
Vižinada	12.403,84
Kaštelir – Labinci	22.643,67
Sveti Lovreč	15.278,89
UKUPNO	**2.218.109,02**

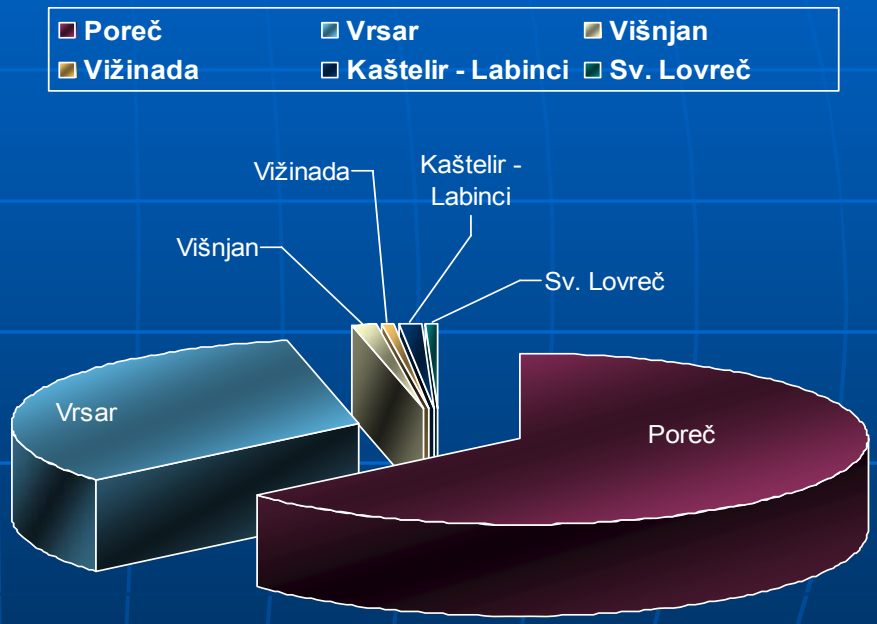

PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA:

- Što hitnije prići sanaciji odlagališta
- Detaljno informirati građane svih jedinica lokalne samouprave o pojedinostima iz razvojnog projekta KOŠAMBRA

- Na predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave donijeti primjerene Odluke o pristupanju Projektu sa potpisivanjem zajedničkog UGOVORA o pravima i obvezama.

Prezentacija za potrebe

IZVRŠNE I PREDSTAVNIČKE VLASTI JLS-e

Poreštine, 14.05.2007.godine
